

3. Phasage

3.1. Généralités

Le chantier se déroulera en deux phases distinct :

Phase 1 : Aménagement de l'entrée OUEST

Phase 2 : Aménagement de l'entrée EST

Les travaux sont réalisés de façon à limiter un maximum la circulation sur la couche de forme.


Les travaux de signalisation horizontale et verticale, les aménagements des espaces verts ainsi que les travaux sur le réseau d'éclairage seront réalisés indépendamment des phases 1 et 2.

3.2. Phase 1 Entrée OUEST

- Phase 1.1 : circulation alternée sur la voirie SUD, zone de travaux voirie NORD, rue du Hohneck fermé.

Démolition des trottoirs et bordures, pose des avaloirs, pose des maçonneries trottoir, préparation des trottoirs.


Schéma de signalisation Phase 1.1

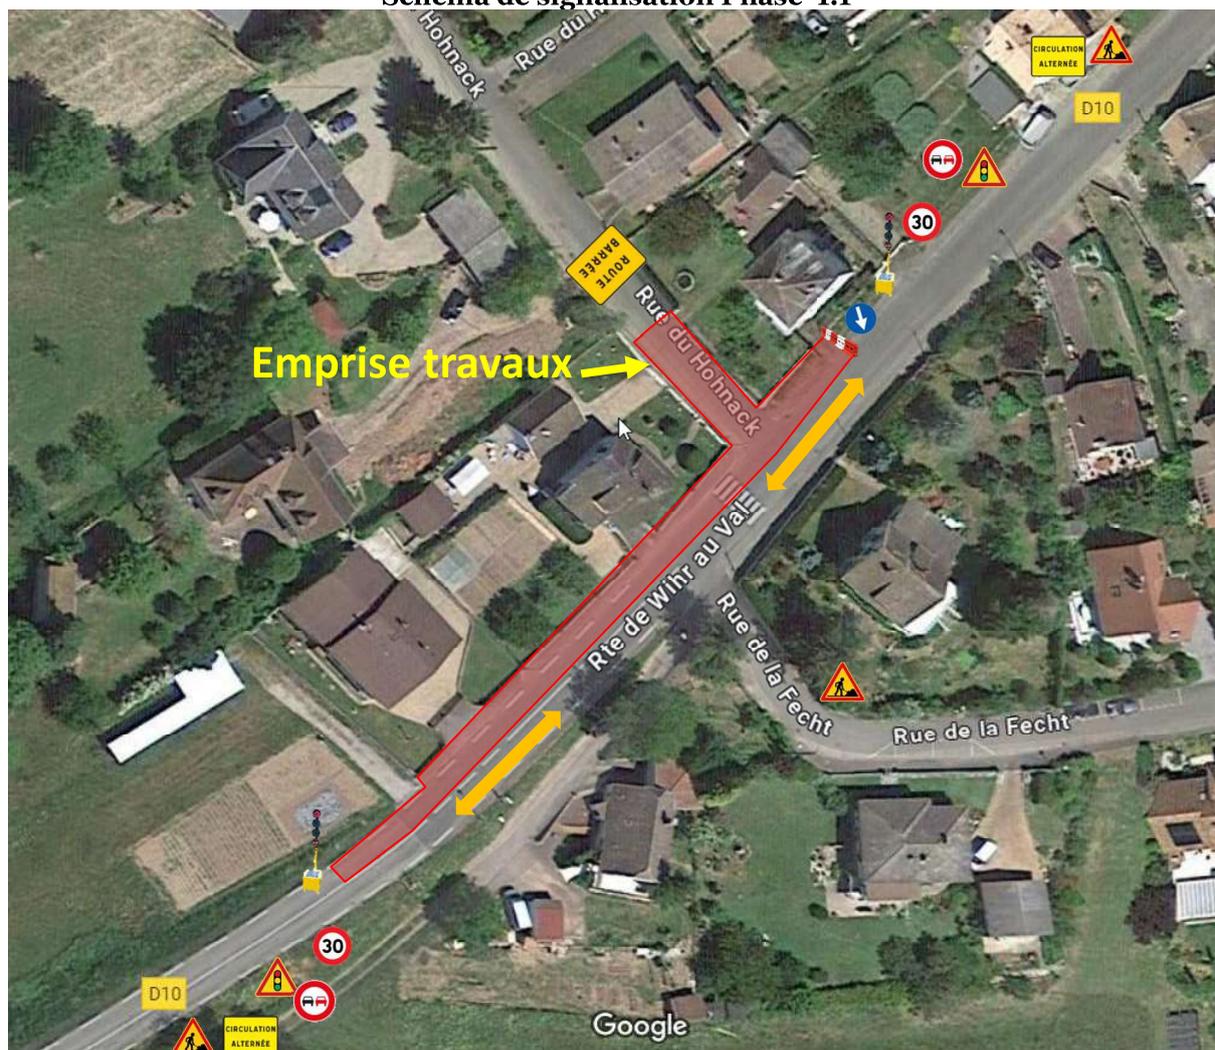

- Phase 1.2 : circulation alternée sur la voirie NORD, zone de travaux voirie SUD, rue de la Fecht fermé.

Démolition des trottoirs et bordures, pose des avaloirs, pose des maçonneries trottoir, préparation des trottoirs.

Schéma de signalisation Phase 1.2

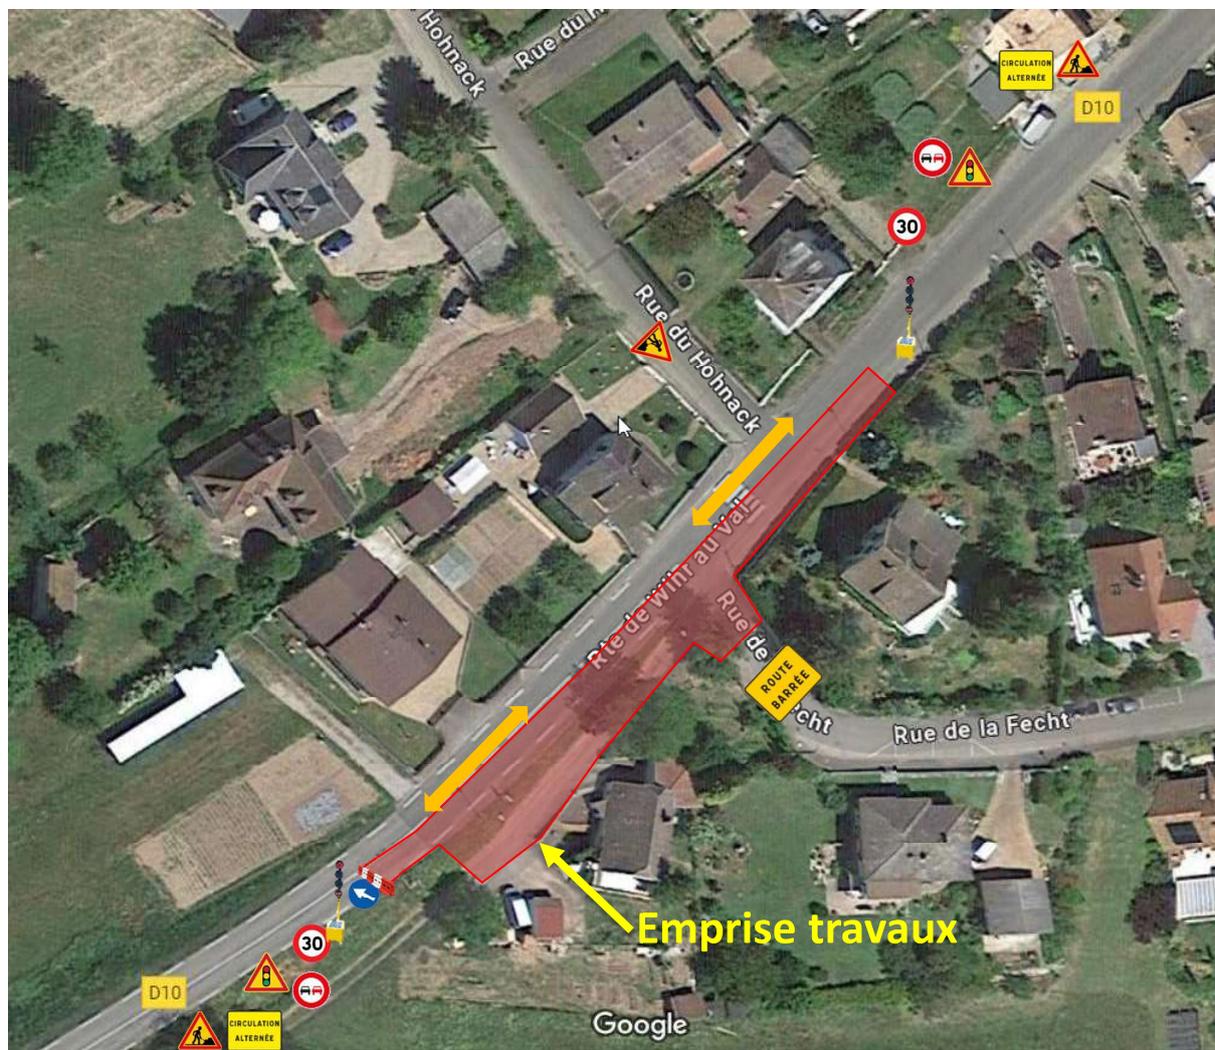

- Phase 1.3 : rabotage de la voirie, réalisation de la couche de forme, réglage avant pose d'enrobé, maçonneries en voirie

Travaux réalisés en route barrée de façon identique à la phase 1.4.

- Phase 1.4 : pose des enrobés sur trottoir en circulation alterné, et des enrobés en voirie sous route barrée un mercredi ou période de vacances scolaire à la demande de la commune.

Plan de déviation, chantier sous route barrée phase 1.3 et 1.4




3.3. Phase 2 : Entrée EST

- Phase 2.1 : circulation alternée sur la voirie SUD, zone de travaux voirie NORD, rue du Saint Sébastien fermé.

Démolition des trottoirs et bordures, pose des avaloirs, pose des maçonneries trottoir, préparation des trottoirs.


Schéma de signalisation Phase 2.1

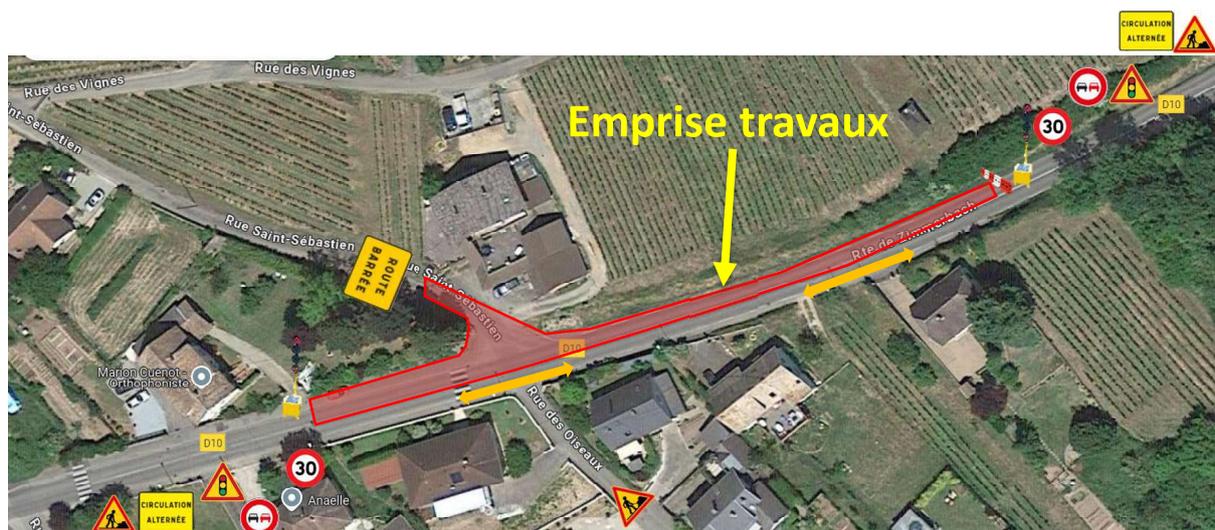

- Phase 2.2 : circulation alternée sur la voirie NORD, zone de travaux voirie SUD, rue des oiseaux fermé.

Démolition des trottoirs et bordures, pose des avaloirs, pose des maçonneries trottoir, préparation des trottoirs.

Schéma de signalisation Phase 2.2

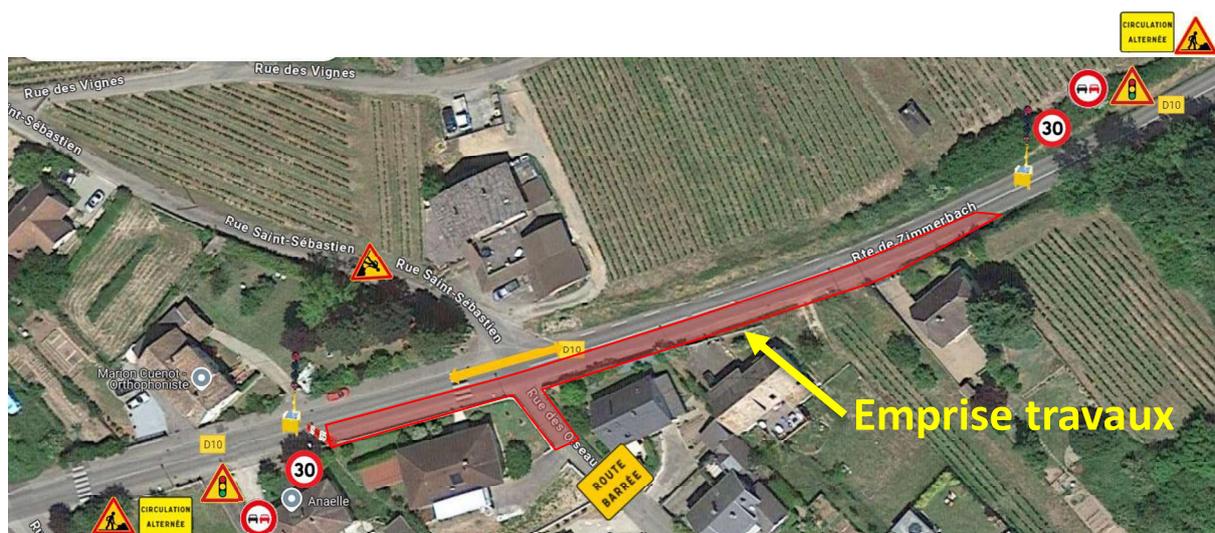

- Phase 2.3 : rabotage de la voirie, réalisation de la couche de forme, réglage avant pose d'enrobé, maçonneries en voirie

Travaux réalisés en route barrée de façon identique à la phase 2.4.

- Phase 2.4 : pose des enrobés sur trottoir en circulation alterné et des enrobés en voirie sous route barrée un mercredi ou période de vacances scolaire à la demande de la commune.

Plan de déviation, chantier sous route barrée phase 2.3 et 2.4

